Relatório de estado · Implementação Comercial Júnior Neves

Oct 22, 2026 · @Otavio Melim

Base: CONTEXTO do projeto, versão 1.4 de 20/10/2026, as fontes F1 a F10, as conversas do projeto de 19 a 22/10 e a pasta do cliente. Duas entregas são mais novas que o CONTEXTO e ainda não estão registradas nele: a Ficha do Serviço v0.1 (20/10) e o artefato interativo Implantação Safra (22/10).

O veredito

O projeto tem pesquisa de sobra e decisão de menos. Entre 19 e 22/10, saiu de uma call de brainstorming para um serviço desenhado até o Portão 2, mas preço, duração, meta e quem é o head seguem abertos desde a call.

Sem meta, não há conta reversa nem plano de lançamento. Sem cliente fundador, não há prova de terceiro. E sem prova, a autoridade pública do Júnior, que é de bastidor de lançamento e não de vendas, não sustenta um funil frio.

A recomendação é trocar de modo: parar de pesquisar, fazer uma sessão de decisão com o Júnior e o Euclides até 28/10, documentar a safra de julho em 29/10 e pré-vender três clientes fundadores pela rede do Euclides, antes de qualquer VSL.

Indicador	Hoje
Fontes no Mapa de fontes	10 (4 no projeto, 6 fora dele)
Versões do CONTEXTO	1.0 a 1.4, todas de 20/10
Decisões registradas	8, nenhuma sobre preço, duração, meta, verba ou capacidade
Decisões pendentes para fechar a oferta	7 do Portão 2, mais meta, verba, quem vende e o papel do Otavio
Clientes, pré-vendas ou aplicações	0
Provas de terceiros	0

O que foi feito

Em quatro dias de calendário, o projeto juntou dez fontes, cinco versões do CONTEXTO, uma Ficha do Serviço e um simulador. A tabela vai da entrega mais recente à mais antiga.

Data	Entrega	O que trouxe	Onde está
22/10	Artefato interativo Implantação Safra	Relógio das safras, jornada de 13 semanas clicável, simulador em três cenários e as sete decisões do Portão 2	Implantação Safra
20/10	Ficha do Serviço v0.1, Portão 2	Implantação Safra de 90 dias por R$ 45 mil, seguida de Head as a Service; cinco etapas, dez entregáveis com critério de pronto, 13 semanas e conta preliminar	Ficha do Serviço e pasta 2. Produto
20/10	Brainstorm de formatos de produto	Sete formatos e uma composição: diagnóstico pago, implementação de 6 meses com Colheita, assinatura por safra e tecnologia como horizonte	Só na conversa
20/10	CONTEXTO 1.4	Entra F10; mercado reescrito com territórios livres e ocupados; correções sobre Antônio Silva, Growth Machine e o Júnior	Projeto (versão vigente)
20/10	Concorrência no nicho de vendas	10 dossiês, linha de base do Instagram do Júnior e cerca de 170 afirmações checadas por um verificador independente, com 12 correções	F10 e documento

Data	Entrega	O que trouxe	Onde está
20/10	Mapeamento de influenciadores de vendas high ticket	A DMB já ocupa "implementadora comercial"; Diego Vicente vende implementação no ecossistema Marçal	Conversa; absorvido por F10
20/10	CONTEXTO 1.0 a 1.3	Síntese de F1 a F6; entram o Método Safra (F7), a busca sobre safra e coorte (F8), o Mapa de fontes, as instruções revisadas e o perfil público do Júnior (F9)	Projeto (superadas)
20/10	Raio-X do mercado de educação em vendas, 5 marcas	Sofisticação no estágio 4 a 5, alcance emprestado e escada de preços	F6, pasta local e artefatos do Raio-X
Até 20/10	Pesquisa de persona, Voz do Cliente, Buyer Persona e Mapa de Empatia	Persona "Rafa, o Dono-Closer", de 35 vozes públicas e sem entrevistas, e as feridas de compra	F2 no projeto; F3, F4 e F5 na pasta local
19/10	Call de brainstorming, 1h36	A sociedade, a tese "impressora 3D", o painel do leilão, a primeira conta de preço e quatro leituras de ICP	F1, só na pasta local

Fora do Mapa de fontes ficou o arquivo do BPX, de novembro de 2025: Projeto v1.1, Documento de Concepção Narrativa 2.0 (ecossistema GHX), mapa de empatia da Formação Growth Hacker, call de extração em vídeo e áudios. O público era outro, o profissional de marketing no platô, mas o documento narrativo traz a voz do Júnior em primeira pessoa, arquétipo, antagonista e guia: matéria-prima para a leitura 20 (história de origem).

Onde o projeto está, camada por camada

A pesquisa está concluída e a oferta parou no Portão 2. Todas as camadas seguintes dependem de decisões dos sócios, não de mais trabalho da Soulstory.

Camada	Estado	Leitura
Pesquisa	Concluída	Suficiente para decidir. Mais pesquisa agora rende pouco, salvo as entrevistas de validação
Mecanismo	Escolhido, sem formulação	Safra decidido em 20/10; a frase do mecanismo único não existe e o nome colide com o Banco Safra
Brief, Portão 1	Não formalizado	O diagnóstico está na seção 9 do CONTEXTO, mas nunca foi aprovado pelos sócios
Posicionamento	Não iniciado	Os territórios livres estão mapeados (safra e métrica em contrato); falta escolher e escrever
Oferta, Ficha do Serviço	v0.1, parada no Portão 2	Espera quatro respostas: gerente de safra, tecnologia, Colheita e níveis do Head as a Service
Preço, garantia e escada	Não iniciado	Portão 3, com planilha de fórmulas
Funil e lançamento	Não iniciado	Preferência registrada (VSL, aplicação, SDR e call), sem meta para a conta reversa
Peças e testes	Não iniciados	Correto pelos princípios do projeto: ainda não há oferta validada
Tecnologia	Em produção pela Cyntia	Documentação dos 6 agentes prevista para perto de 26/10; CRM em beta

O projeto pulou o Brief formal e foi direto à oferta. Isso não é grave, porque o material do diagnóstico existe. O problema é que nenhuma leitura virou decisão aprovada.

O que está sólido

O mecanismo e o desenho da oferta estão bons o bastante para ir à mesa com os sócios e com os primeiros compradores.

- **O mecanismo tem território livre (forte, F10).** Nenhum dos dez concorrentes usa safra, coorte ou maturação, e nenhum põe métrica de entrega em contrato. Implementação, previsibilidade, IA comercial e dono com time já estão ocupados.
- **A Ficha resolve a contradição dos 90 dias sem esconder nada.** A implantação é medida pelas safras herdadas, que fecham no prazo, e pelos indicadores de etapa das novas; as novas fecham no Head as a Service. Dito na call, isso vira argumento em vez de "pegadinha do terceiro mês".
- **O desenho responde às feridas da persona (F2, F3).** Sênior nomeado, critério de pronto por entregável, saída mês a mês sem multa, dados exportados e nenhum acesso retido. Isso também desarma a trava de CRM, que o CONTEXTO marca como risco (leitura 8).
- **A base de evidência é rastreável.** Cada fato tem fonte, cada achado tem grau, e os erros de resumo foram corrigidos na versão 1.4.

O que está frágil

Seis pontos, em ordem de impacto. Os três primeiros travam o projeto; os outros três pesam quando a venda começar.

1. **Decisões de negócio.** Preço, duração, faixa e nicho do primeiro ataque, meta, verba e quem vende seguem abertos desde 19/10. Também está aberto o papel e a remuneração do Otavio (lacuna 13): toda a produção até aqui foi feita sem esse acordo.
2. **Prova de terceiros: zero.** O painel do leilão prova o método na operação do Júnior, e a leitura por safra ainda é experimental (F7). A safra de julho fecha em 29/10, e os 127 pré-qualificados ainda têm duas leituras (lacuna 12).
3. **A conta depende de uma hipótese sem lastro.** A implantação de R$ 45 mil deixa cerca de R$ 5.740 depois da aquisição (12,8%); no cenário base do simulador, o Head as a Service responde por cerca de 82% do valor de cada cliente. Isso pressupõe que metade siga para a recorrência, e a persona traz a ferida de "2 reuniões mensais que não levam a lugar nenhum" (RA-05).
4. **Dependência do fundador e capacidade.** A independência do fundador teve nota 1 de 3 na Ficha. Não há gerente de safra além do Júnior, que mora na região de Orlando e deve fazer as calls de venda (cerca de 43 horas por mês para 10 calls por semana). A tecnologia gasta 70 horas por implantação, com o CRM em beta.

5. **Autoridade pública desalinhada.** Nenhum post sobre venda consultiva ou gestão comercial em 60; engajamento de 0,13% nos posts de negócio; o comprador não aparece nos comentários (F10). Um VSL de tráfego frio com o Júnior como rosto começaria sem ponte de autoridade.
6. **Preço vizinho e riscos de associação.** R$ 45 mil por 90 dias fica ao lado do exemplo de R$ 50 mil por 90 dias da Growth Machine. Segundo turno em 25/10, sociedade pública com Marçal e Diego Vicente vendendo implementação comercial no mesmo ecossistema, com evento em 30 e 31/10. "Método Safra" ainda não passou pelo INPI.

Divergências abertas dentro do projeto

Seis temas têm duas versões registradas. Duas delas a Soulstory resolve sozinha (duração e porta de entrada); as outras quatro vão para a sessão com os sócios.

Tema	Uma posição	Outra posição	Recomendação
Duração	CONTEXTO, leitura 4: mínimo de 6 meses	Ficha v0.1: 90 dias e depois Head as a Service	Ficar com a Ficha e corrigir a leitura 4 na versão 1.5
Porta de entrada	Brainstorm: diagnóstico de safras pago, abatido na implementação	Ficha: leitura rápida e gratuita na call	As duas. Gratuita na call do funil; a Leitura das Safras vendida sozinha aos fundadores, como teste de demanda e primeira prova em 3 semanas, não em 13
Preço	F1: R$ 45 mil em 3 meses e R$ 15 mil por mês	F7: R$ 60 mil por 6 meses, ou R$ 50 mil mais R$ 10 mil por mês	Decisão dos sócios, com o simulador na mesa
CRM	F1: CRM próprio como trava	F7 e Ficha: CRM do cliente ou GoHighLevel	CRM do cliente ou GoHighLevel nos fundadores; o próprio, quando sair do beta


Tema	Uma posição	Outra posição	Recomendação
Papel do Júnior	F1 e F7: o Júnior no acompanhamento contínuo	Ficha: sozinho, ele sustenta de 8 a 10 clientes no rito	Perguntar a ele se quer rodar a operação do cliente ou ser o dono do método que forma quem roda
Comprador	Persona (F2): o dono que vende e decide sozinho	Produto: pressupõe um responsável pela operação (leitura 10)	Manter o critério de entrada da Ficha (duas ou mais pessoas vendendo) e criar um adicional que forma esse responsável quando ele não existe

Próximos passos

O caminho tem dois portões: decisões dos sócios até 29/10 e três fundadores assinados até 30/11. Nada de funil, tráfego ou peça antes do segundo.

Dois marcos vêm antes do funil: decisões em 29/10 e fundadores em 30/11

Próximos passos de outubro de 2026 a março de 2027, com o calendário do mercado no mesmo período

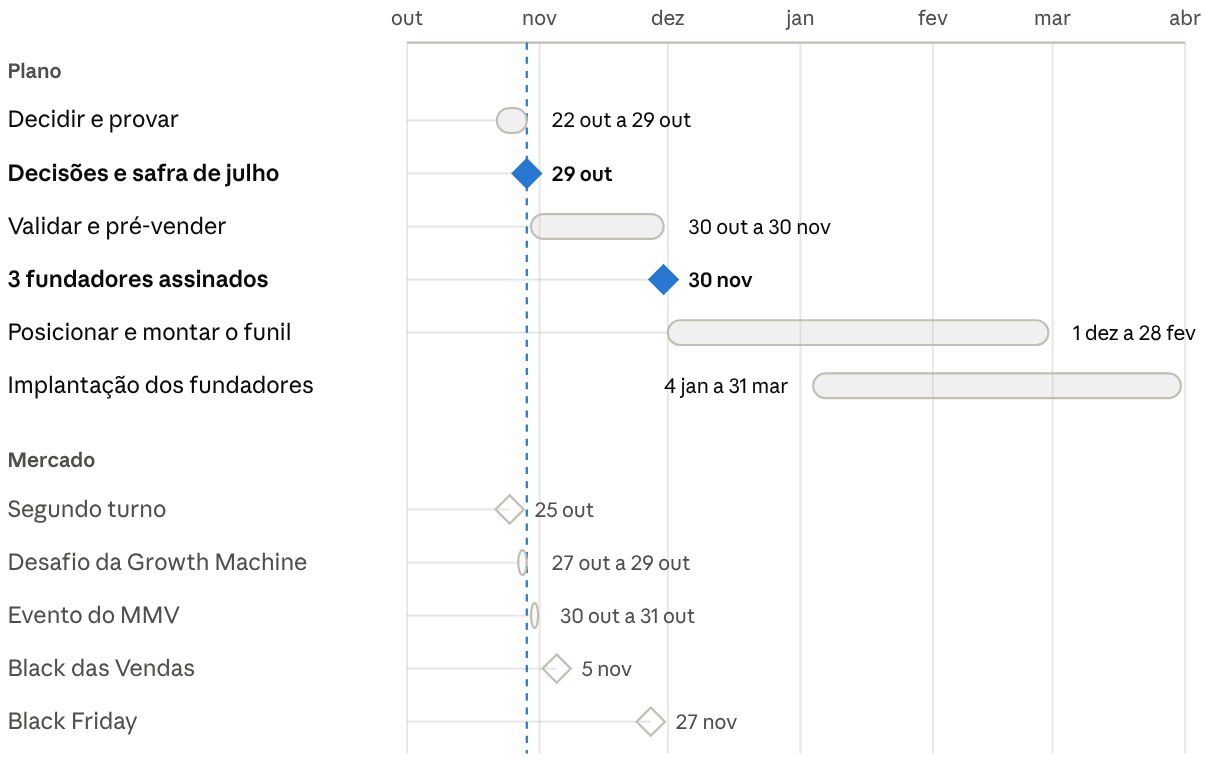

roteiro · 3 fases, 2 marcos e o calendário do mercado

Até o segundo marco, a venda é direta pela rede do Euclides, enquanto o mercado disputa atenção com desafio, evento e Black.

Até 29/10: decidir e provar

- [ ] **Sessão de decisão com o Júnior e o Euclides, até** Oct 28, 2026 **.** De 60 a 90 minutos, com pauta fechada: as sete decisões do Portão 2, meta com número e prazo, verba, quem vende e o papel e a remuneração do Otavio. O simulador da Implantação Safra é o material da mesa.
- [ ] **Fechar e documentar a safra de julho em** Oct 29, 2026 **.** Números por etapa, print do painel e a resposta sobre os 127 pré-qualificados. Vira a primeira prova e o modelo do laudo da Leitura das Safras.
- [ ] **Revisar com a Cyntia, perto de** Oct 26, 2026 **, a documentação dos 6 agentes** e as 70 horas de tecnologia por implantação, o maior custo e o gargalo das primeiras semanas.
- [ ] **Pôr o projeto em dia.** CONTEXTO 1.5 (proposta no fim); subir F1, F3, F4, F5 e F6 da pasta local como arquivos FONTE-, para trazer o CONTEXTO de 3.416 para cerca de 3.000 palavras; apagar a cópia de F9 na raiz e a segunda cópia de 00-guia-de-uso.md; renomear Buyer Persona.md para FONTE-buyer-persona.md.

De 30/10 a 30/11: validar e pré-vender

- [ ] **Portão 3 da Ficha:** preço em níveis, garantia cumprível (igual ou melhor que os 7 dias do CDC), a Leitura das Safras paga como degrau e a planilha com fórmulas.
- [ ] **De 8 a 10 entrevistas com donos do perfil** (plano em F2), testando a ficha resumida e o preço, e perguntando quanto pagaram de fato à Growth Machine, à Full Sales ou à Legacy (lacuna 11).
- [ ] **Pré-venda de 3 clientes fundadores** pela rede do Euclides, com preço de fundador em troca de caso documentado e permissão de uso. Início na safra de janeiro: as safras herdadas de outubro a dezembro já rendem a primeira Colheita. O mercado já vende o fim de ano como plano de 2027; a janela é essa.
- [ ] **Nomes:** consulta ao INPI para "Safra"; nome em português para o Head as a Service (Manejo, Head de Safra ou Gestão de Safra); confirmação de "Triad".

De dezembro a fevereiro: só com fundadores assinados

- [ ] Brief e Posicionamento formais, com o mecanismo único escrito e a Big Idea.
- [ ] Plano de lançamento do funil (VSL, aplicação, SDR e call) com meta, conta reversa e rastreamento íntegro antes de qualquer verba.
- [ ] Conteúdo-ponte no perfil do Júnior: o painel do leilão, o bastidor de lançamento lido como funil e, depois, os casos dos fundadores.

O que não fazer agora

- Gravar VSL, subir tráfego ou escrever página de vendas: não há oferta validada nem meta.
- Abrir nova frente de pesquisa de concorrência: o que falta sai das entrevistas e dos fundadores.
- Usar Marçal ou o vídeo fixado em qualquer peça antes da decisão dos sócios (lacuna 9), e nada nesse sentido antes do segundo turno, em 25/10.
- Disputar atenção entre 27/10 e 05/11, com o desafio da Growth Machine, o evento do MMV e a Black das Vendas. É período de venda direta pela rede, não de lançamento.
- Prometer faturamento. A promessa vende operação instalada e dinheiro parado de volta, como está na Ficha.

Decisões do cliente e hipóteses a validar

São as decisões que só o Júnior e o Euclides podem tomar, separadas das recomendações acima. A última é entre eles e o Otavio.

Decisões do Júnior e do Euclides

1. 90 dias mais Head as a Service, ou 6 meses.
2. Preço da implantação e do Head as a Service; um nível ou três; mês a mês ou prazo mínimo.
3. Leitura das Safras vendida sozinha aos fundadores, ou só gratuita na call.
4. Quem é o gerente de safra dos fundadores: Júnior, Tati ou outra pessoa.
5. Tecnologia dos fundadores: CRM da Triad, do cliente ou GoHighLevel.
6. Colheita feita pelo time do cliente ou pela Triad, como opcional pago.
7. Faixa e nichos do primeiro ataque; volume mínimo de leads e de pessoas vendendo.
8. Meta com número e prazo, verba e quem vende.
9. Uso da associação com Marçal.
10. Nomes: Triad, Método Safra e Implantação Safra.
11. Papel e remuneração do Otavio.

Hipóteses a validar

- O dono do perfil paga pela Leitura das Safras antes de assinar a implantação (indicativa).
- Pelo menos metade dos clientes segue para o Head as a Service (indicativa; é o que sustenta a conta).
- As safras herdadas, trabalhadas com a nova régua, fecham acima da linha de base dentro dos 90 dias (indicativa).
- A implantação cabe em cerca de 180 horas, e um gerente de safra sustenta 2 implantações e 5 clientes recorrentes (hipótese).
- Cerca de 100 leads por mês é o mínimo para a leitura por etapa (hipótese).
- A safra de julho fecha com números que sirvam de prova pública (não avaliável até 29/10).

Proposta de atualização do CONTEXTO, versão 1.5

O CONTEXTO está dois passos atrás do trabalho e 416 palavras acima do limite. A atualização rende mais logo depois da sessão de decisão, para registrar as respostas de uma vez.

Entra

- Na seção 11, como direção de trabalho e não como decisão dos sócios: implantação de 90 dias por R$ 45 mil, seguida de Head as a Service (Otavio, a partir de F1).
- Na seção 12: o brainstorm de formatos (proposta, 20/10), a Ficha do Serviço v0.1 (Portão 2, aguardando decisões) e o artefato Implantação Safra (22/10).
- No Mapa de fontes: o arquivo do BPX de novembro de 2025, a abrir para a história de origem (leitura 20).
- Nas lacunas: a Leitura das Safras paga como degrau e a taxa de continuidade como a métrica que decide o negócio.

Muda

- Leitura 4: de "mínimo de 6 meses" para "90 dias fecham as safras herdadas; as novas fecham na continuidade, e isso precisa ser dito na venda".
- Mapa de fontes: F1, F3, F4, F5 e F6 passam a arquivos FONTE- no projeto, se você subi-los.

Sai

- O detalhe de F1 e de F3 a F6 que passar a morar nas fontes, para o arquivo voltar a cerca de 3.000 palavras.
